ID	Nombre de tarea	Duration
1	HITOS OTROS PROYECTOS	634 days
2	**O.C.: PK 0+000 - 0+625 (Florida - Vicente Aleixandre)**	**75 days**
3	Plataforma	35 days
4	Parada de Santa Lucia	30 days
5	Infraestructura de via	40 days
6	**O.C.: PK 0+625 - 0+960 (Vicente Aleixandre - Rotonda Budapest)**	**45 days**
7	Plataforma	20 days
8	Infraestructura de via	25 days
9	**O.C.: PK 0+960 - 1+250 (Rotonda Budapest - Rotonda Boulevar Salburua)**	**47 days**
10	Plataforma	20 days
11	Parada de Iliada	30 days
12	Infraestructura de via	27 days
13	**O.C.: PK 1+250 - 1+620 (Rotonda Boulevar Salburua - Avda. Varsovia)**	**49 days**
14	Plataforma	21 days
15	Parada de Nikosia	30 days
16	Infraestructura de via	28 days
17	**O.C.: PK 1+620 - 1+910 (Avda. Varsovia - La Union)**	**50 days**
18	Plataforma	21 days
19	Parada de La Union	30 days
20	Infraestructura de via	29 days
21	**O.C.: PK 1+910 - 2+150 (Union - Viena)**	**48 days**
22	Plataforma	19 days
23	Infraestructura de via	29 days
24	**O.C.: PK 2+150 - 2+200 (Viena)**	**26 days**
25	Plataforma	9 days
26	Infraestructura de via	17 days
27	**O.C.: Paseo Aerodromo**	**49 days**
28	Plataforma	20 days
29	Infraestructura de via	29 days
30	**O.C.: Avda. Roma**	**27 days**
31	Plataforma	13 days
32	Infraestructura de via	14 days
33	**O.C.: Juan Carlos I - Paris**	**30 days**
34	Plataforma	12 days
35	Infraestructura de via	18 days
36	**O.C.: PK Juan Carlos I Final**	**46 days**
37	Plataforma	20 days
38	Parada de Salburua	30 days
39	Infraestructura de via	26 days
40	ST: Enclavamiento Florida	0 days
41	ST: Enclavamiento Nikosia	0 days
42	ST: Enclavamiento Salburua	0 days
43	**PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN VIARIA DE LA AMPLIACIÓN DEL TRANVÍA DE VITORIA-GASTEIZ A SALBURUA**	**659 days**
44	Replanteo de Cruces	1 wk
45	Ingeniería de detalle gestión prioridad	1 mon
46	Acopios	3 mons
47	**CRUCE Nº1: Florida - José Lejarreta**	**75 days**
48	Canalización auxiliar y obra civil	1 wk
49	Colocación de espiras	2 wks
50	Colocación de semáforos	2 wks
51	Actuaciones en regulador	2 wks
52	Cableado y conexiones	2 wks
53	Integración con ST	2 wks
54	Programación y pruebas	1 wk
55	**CRUCE Nº2: Florida - Jacinto Benavente**	**75 days**
56	Canalización auxiliar y obra civil	2 wks
57	Colocación de espiras	2 wks
58	Colocación de semáforos	2 wks
59	Actuaciones en regulador	2 wks
60	Cableado y conexiones	2 wks
61	Integración con ST	2 wks
62	Programación y pruebas	1 wk
63	**CRUCE Nº3: Florida - Vicente Aleixandre**	**65 days**
64	Canalización auxiliar y obra civil	1 wk
65	Colocación de espiras	1 wk
66	Colocación de semáforos	1 wk
67	Actuaciones en regulador	1 wk
68	Cableado y conexiones	1 wk
69	Programación y pruebas	1 wk
70	**CRUCE Nº4: Florida - Los Astronomos**	**40 days**
71	Canalización auxiliar y obra civil	1 wk
72	Colocación de espiras	1 wk
73	Colocación de semáforos	1 wk
74	Actuaciones en regulador	1 wk
75	Cableado y conexiones	1 wk
76	Programación y pruebas	1 wk
77	**CRUCE Nº5: Florida - Budapest - Iliada**	**50 days**
78	Canalización auxiliar y obra civil	2 wks
79	Colocación de espiras	2 wks
80	Colocación de semáforos	2 wks
81	Actuaciones en regulador	2 wks
82	Cableado y conexiones	2 wks
83	Programación y pruebas	1 wk
84	**CRUCE Nº6: Iliada - Praga**	**62 days**
85	Canalización auxiliar y obra civil	1 wk
86	Colocación de espiras	2 wks
87	Colocación de semáforos	2 wks
88	Actuaciones en regulador	2 wks
89	Cableado y conexiones	2 wks
90	Programación y pruebas	1 wk
91	**CRUCE Nº7: Iliada - Boulevar de Salburua**	**67 days**

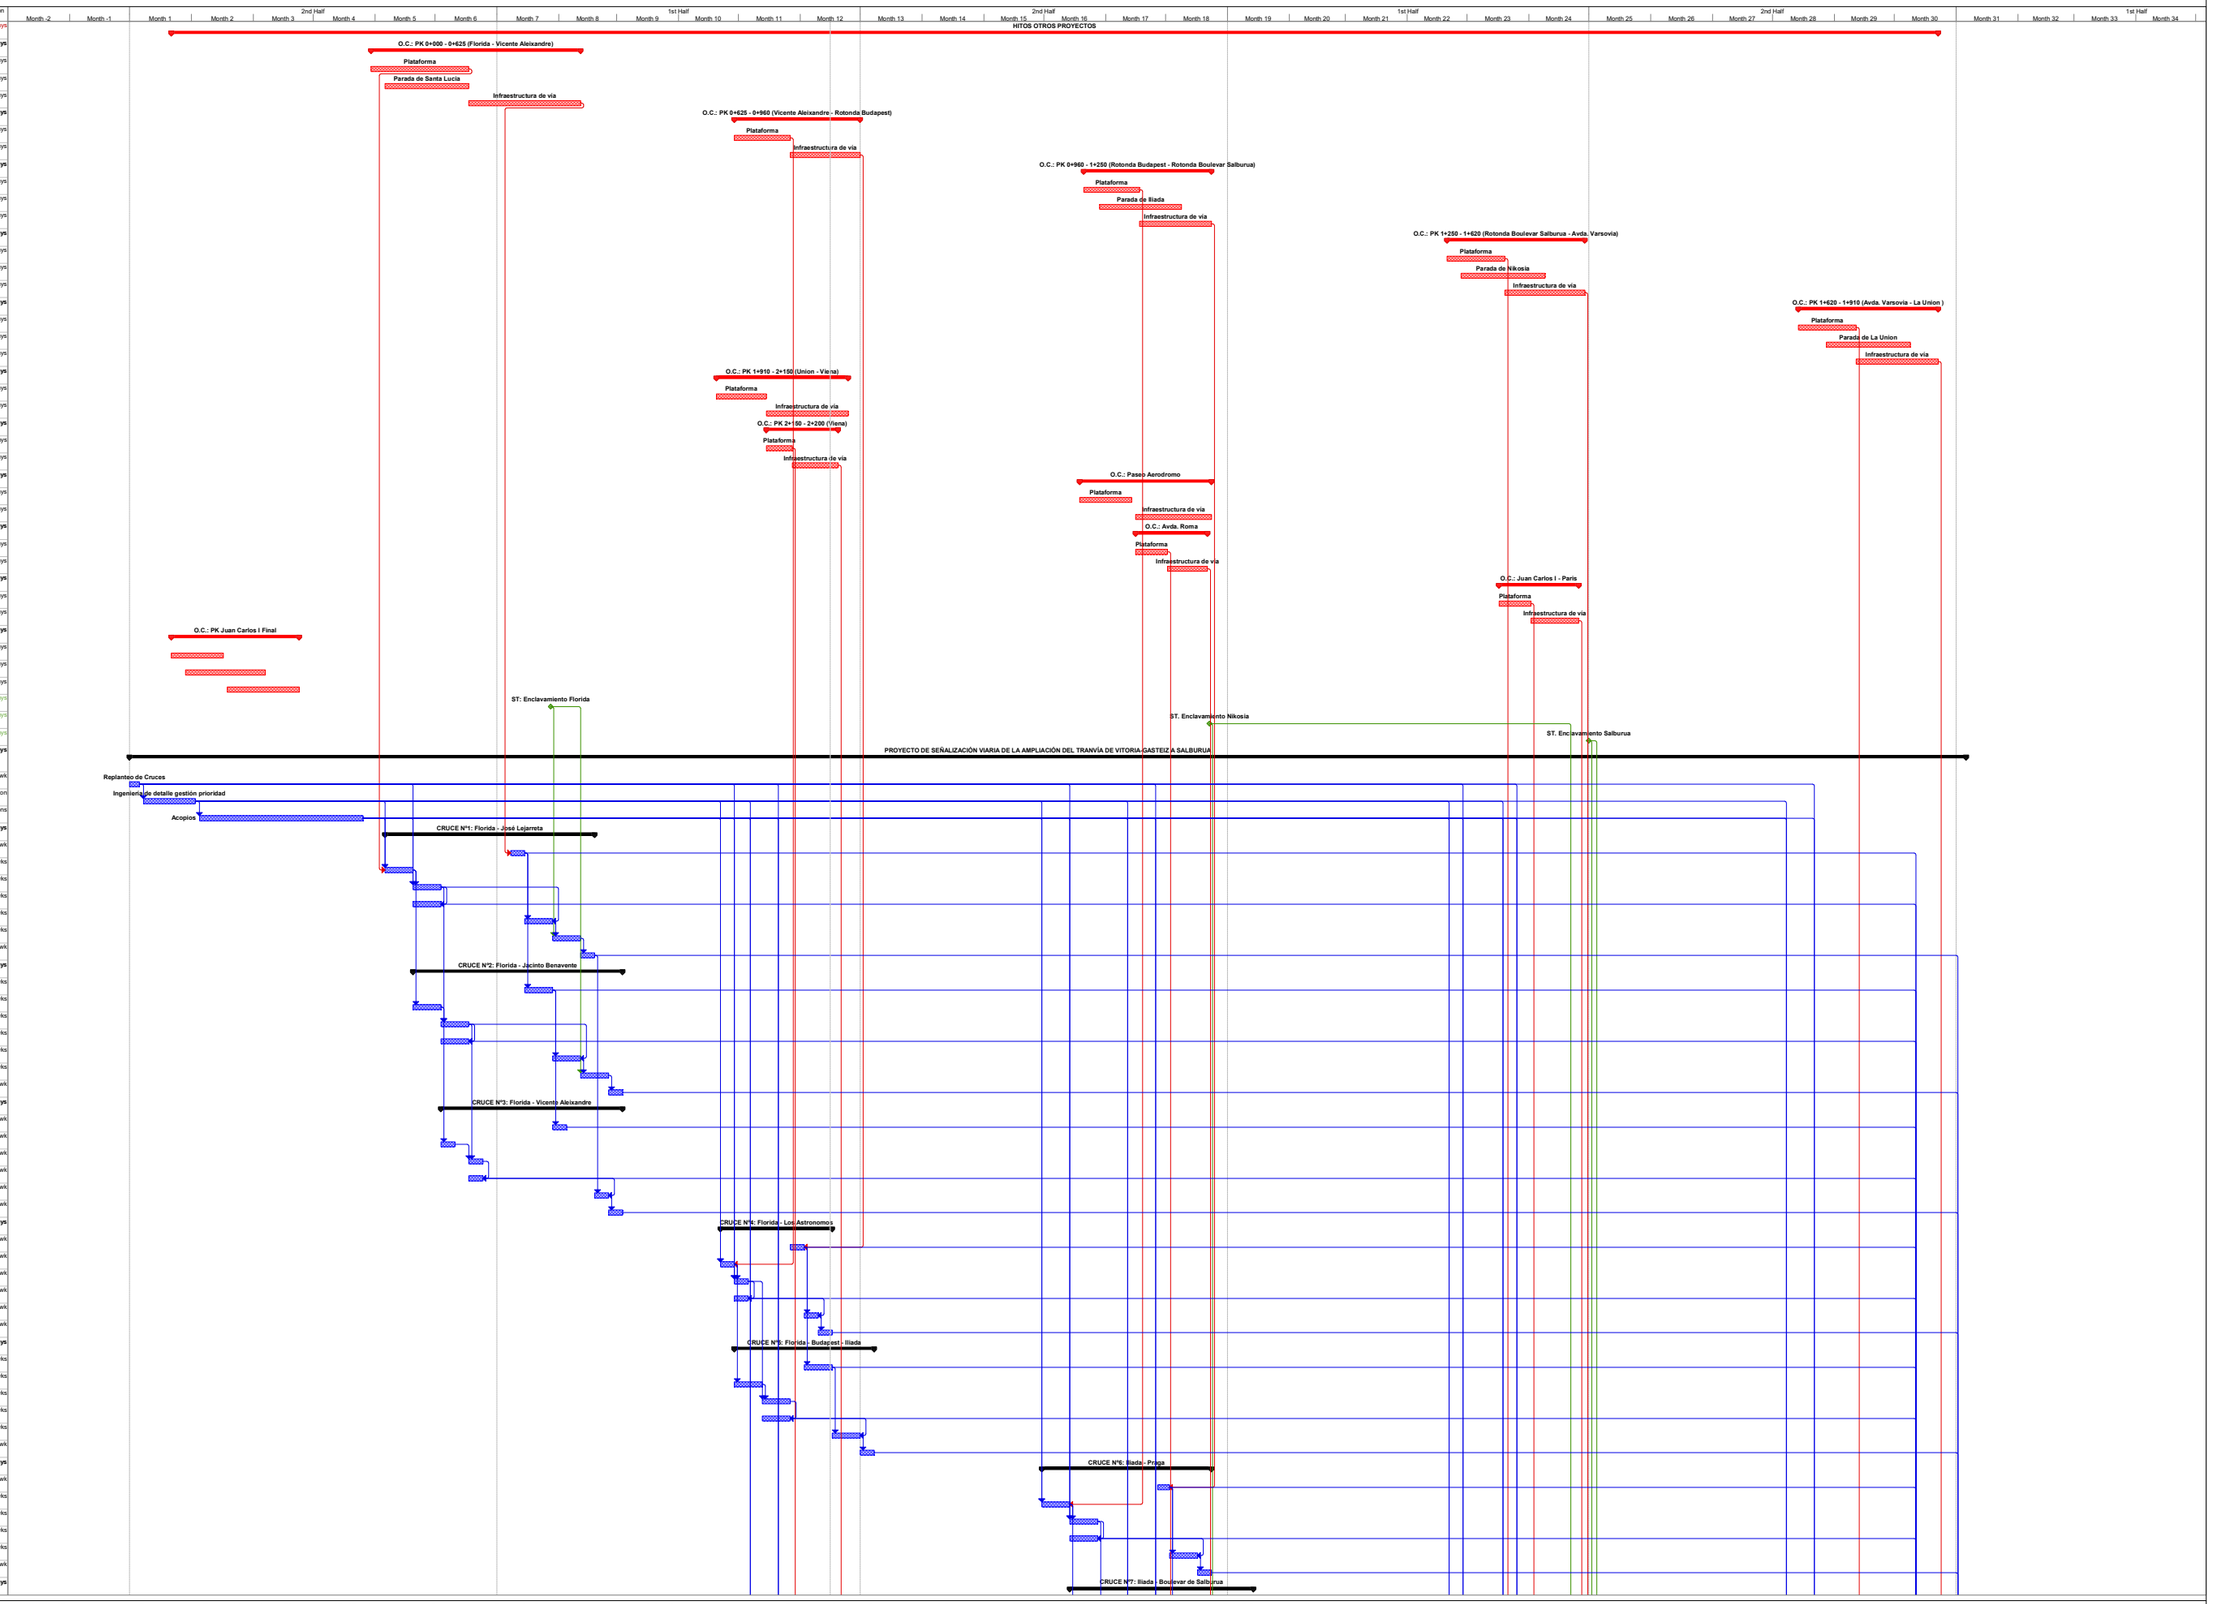

Proyecto: Señalización Viaria
Revisión: 0
Fecha: Junio 2020

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito externo · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Fecha límite
División · Resumen · Tareas externas · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Progreso
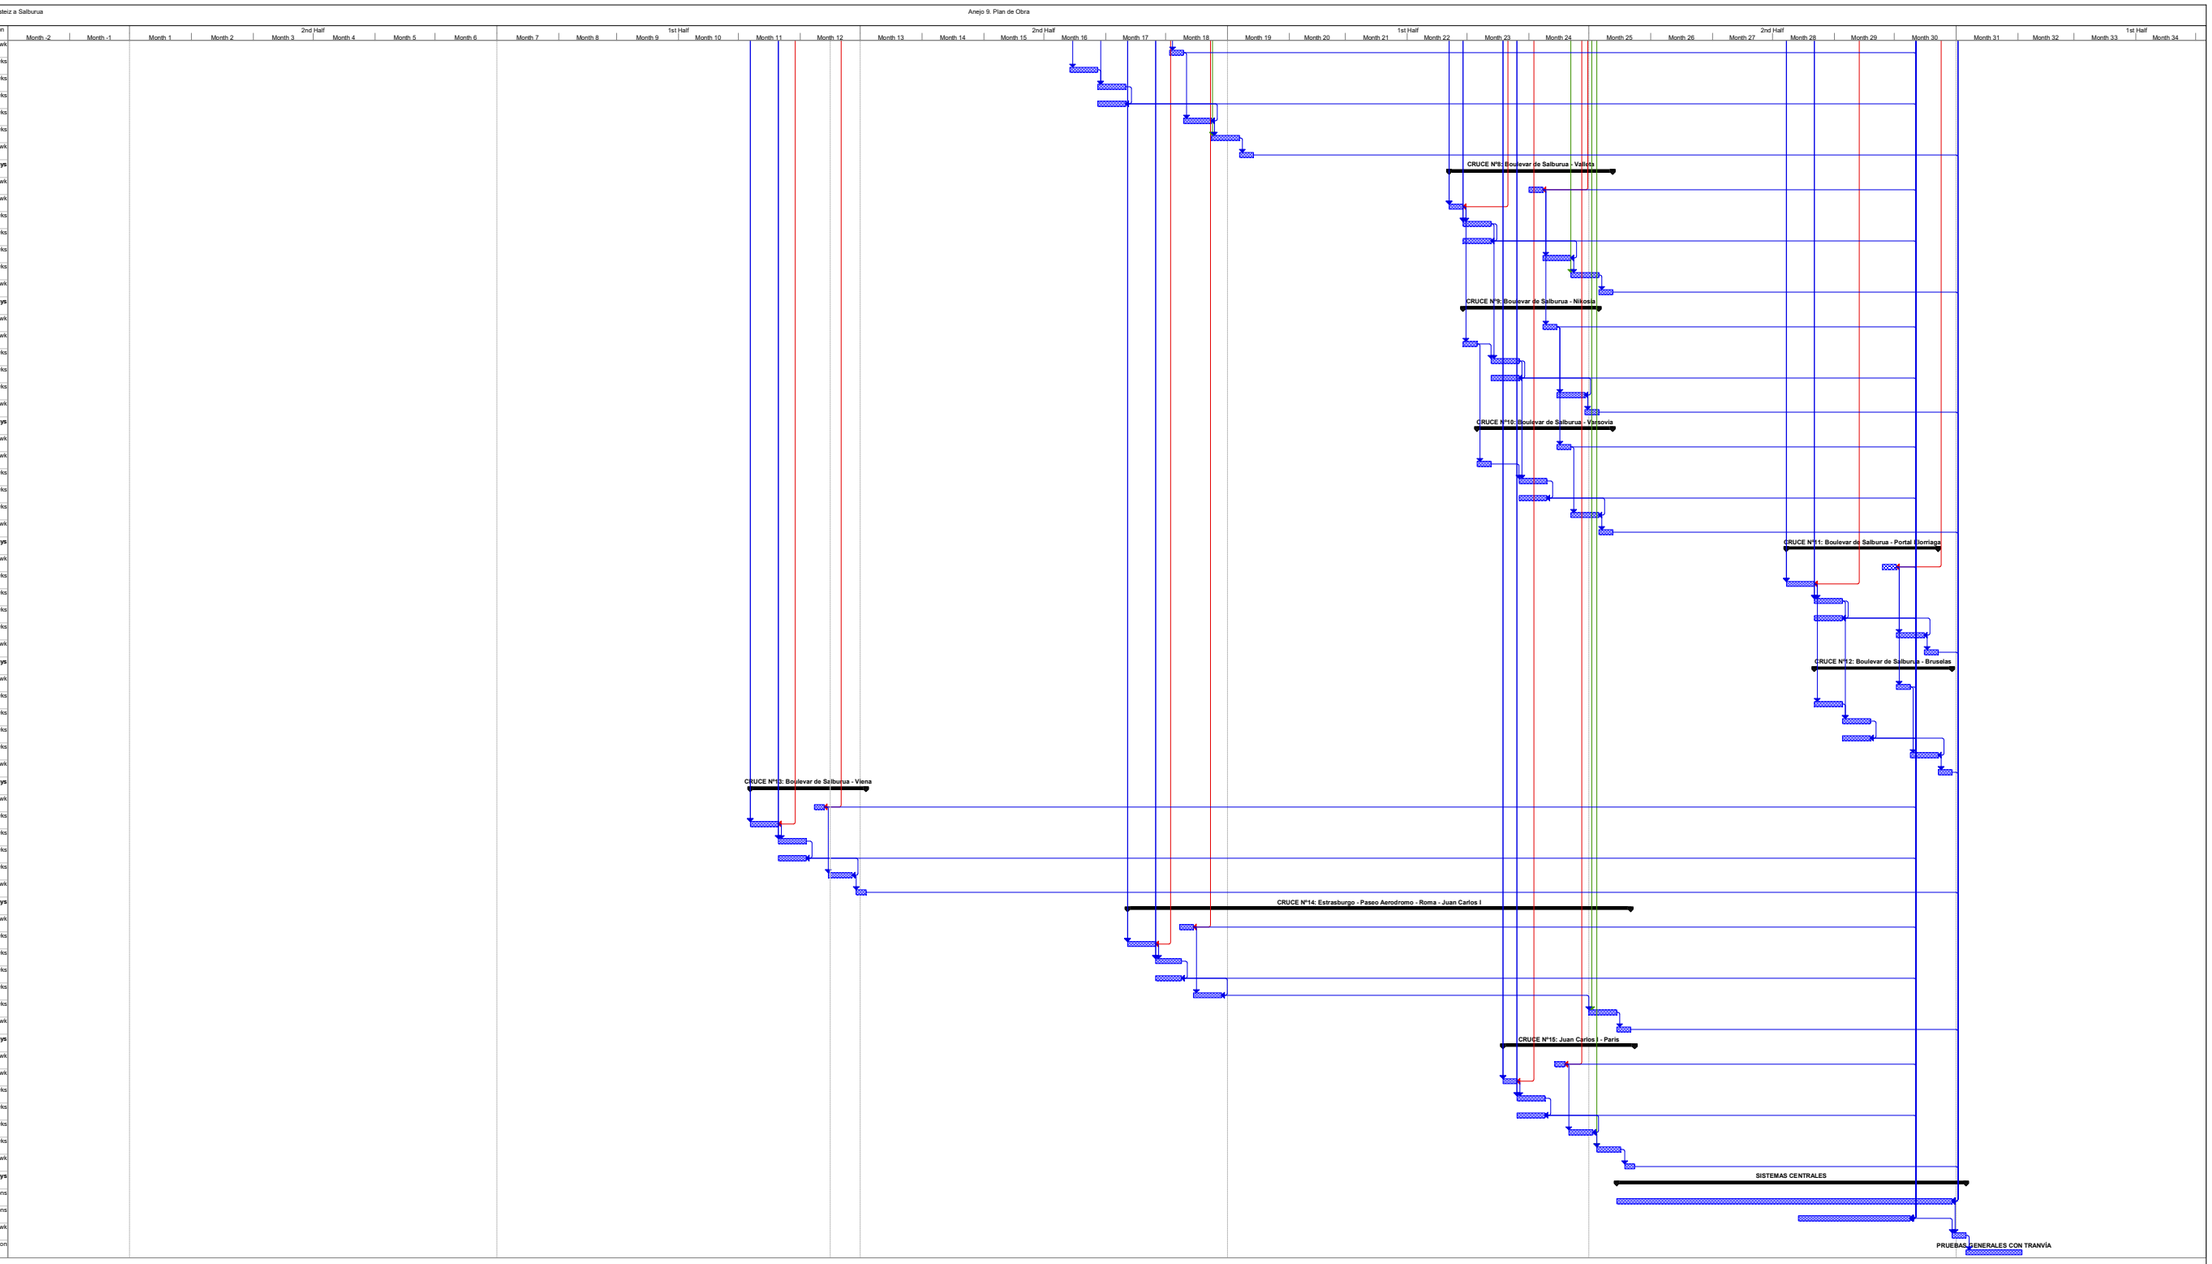
ID	Nombre de tarea	Duration
92	Canalización auxiliar y obra civil	1 wks
93	Colocación de espiras	2 wks
94	Colocación de semáforos	2 wks
95	Actuaciones en regulador	2 wks
96	Cableado y conexiones	2 wks
97	Integración con ST	2 wks
98	Programación y pruebas	1 wk
99	**CRUCE Nº8: Boulevar de Salburua - Valleta**	**58 days**
100	Canalización auxiliar y obra civil	1 wk
101	Colocación de espiras	1 wk
102	Colocación de semáforos	2 wks
103	Actuaciones en regulador	2 wks
104	Cableado y conexiones	2 wks
105	Integración con ST	2 wks
106	Programación y pruebas	1 wk
107	**CRUCE Nº9: Boulevar de Salburua - Nikosia**	**48 days**
108	Canalización auxiliar y obra civil	1 wk
109	Colocación de espiras	1 wk
110	Colocación de semáforos	2 wks
111	Actuaciones en regulador	2 wks
112	Cableado y conexiones	2 wks
113	Programación y pruebas	1 wk
114	**CRUCE Nº10: Boulevar de Salburua - Varsovia**	**48 days**
115	Canalización auxiliar y obra civil	1 wk
116	Colocación de espiras	1 wk
117	Colocación de semáforos	2 wks
118	Actuaciones en regulador	2 wks
119	Cableado y conexiones	2 wks
120	Programación y pruebas	1 wk
121	**CRUCE Nº11: Boulevar de Salburua - Portal Elorriaga**	**54 days**
122	Canalización auxiliar y obra civil	1 wk
123	Colocación de espiras	2 wks
124	Colocación de semáforos	2 wks
125	Actuaciones en regulador	2 wks
126	Cableado y conexiones	2 wks
127	Programación y pruebas	1 wk
128	**CRUCE Nº12: Boulevar de Salburua - Bruselas**	**49 days**
129	Canalización auxiliar y obra civil	1 wk
130	Colocación de espiras	2 wks
131	Colocación de semáforos	2 wks
132	Actuaciones en regulador	2 wks
133	Cableado y conexiones	2 wks
134	Programación y pruebas	1 wk
135	**CRUCE Nº13: Boulevar de Salburua - Viena**	**42 days**
136	Canalización auxiliar y obra civil	1 wk
137	Colocación de espiras	2 wks
138	Colocación de semáforos	2 wks
139	Actuaciones en regulador	2 wks
140	Cableado y conexiones	2 wks
141	Programación y pruebas	1 wk
142	**CRUCE Nº14: Estrasburgo - Paseo Aerodromo - Roma - Juan Carlos I**	**181 days**
143	Canalización auxiliar y obra civil	1 wk
144	Colocación de espiras	2 wks
145	Colocación de semáforos	2 wks
146	Actuaciones en regulador	2 wks
147	Cableado y conexiones	2 wks
148	Integración con ST	2 wks
149	Programación y pruebas	1 wk
150	**CRUCE Nº15: Juan Carlos I - Paris**	**48 days**
151	Canalización auxiliar y obra civil	1 wk
152	Colocación de espiras	1 wk
153	Colocación de semáforos	2 wks
154	Actuaciones en regulador	2 wks
155	Cableado y conexiones	2 wks
156	Integración con ST	2 wks
157	Programación y pruebas	1 wk
158	**SISTEMAS CENTRALES**	**125 days**
159	Adaptación Sistemas Centrales	6 mons
160	Tendido F.O. Centralizacion	2 mons
161	Pruebas y Puesta en Marcha	1 wk
162	**PRUEBAS GENERALES CON TRANVÍA**	1 mon
