

Restaurando los hábitats de los estuarios



PROYECTO LIFE08NAT/E/000055

Restauración de hábitats de interés comunitario
en estuarios del País Vasco

Resumen de avances – 2012/2



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAIALA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL




www.euskadi.net/life_estuarios


AVANCES DEL PROYECTO JULIO-DICIEMBRE 2012


C. ACCIONES CONCRETAS DE CONSERVACIÓN

Acción	Plazo	Estado	Descripción
C1. Primer tratamiento de áreas afectadas por vegetación invasora	30/09/2013	Iniciadas	<p>En Julio se iniciaron los trabajos de eliminación de <i>Baccharis halimifolia</i> en las Islas del Bidasoa, completándose toda la superficie prevista en noviembre. Mientras, se ha continuado con el repaso en Urdaibai.</p> <p>Durante estos meses se han realizado las siguientes superficies:</p> <p>Islas del Bidasoa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Primera actuación (aplicación de herbicida): 20,43 hectáreas <p>Urdaibai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Repaso (arranque manual): 51,4 hectáreas - Repaso (aplicación de herbicida): 15,66 hectáreas - Primera actuación (aplicación de herbicida): 0,31 hectáreas
C2. Repaso de áreas tratadas			<p>Además, se han contratado los trabajos adicionales en Txingudi, para poder completar todas las superficies afectadas en este estuario. En total, se ha ampliado a 11 hectáreas más. Durante 2012 se ha realizado parte de la primera actuación, el resto y los repasos pertinentes se realizarán en 2013:</p> <p>Txingudi (Fase II):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Primera actuación (aplicación de herbicida): 2,10 hectáreas
C3. Revegetación de áreas tratadas	31/05/2013	Iniciada	<p>Una vez definido el plan de revegetación, se ha contactado con la Diputación Foral de Gipuzkoa para la provisión de plantas. La primera fase de la plantación, que se desarrollará de enero a marzo de 2013, consistirá en la plantación de unos 7.000 árboles y arbustos.</p>



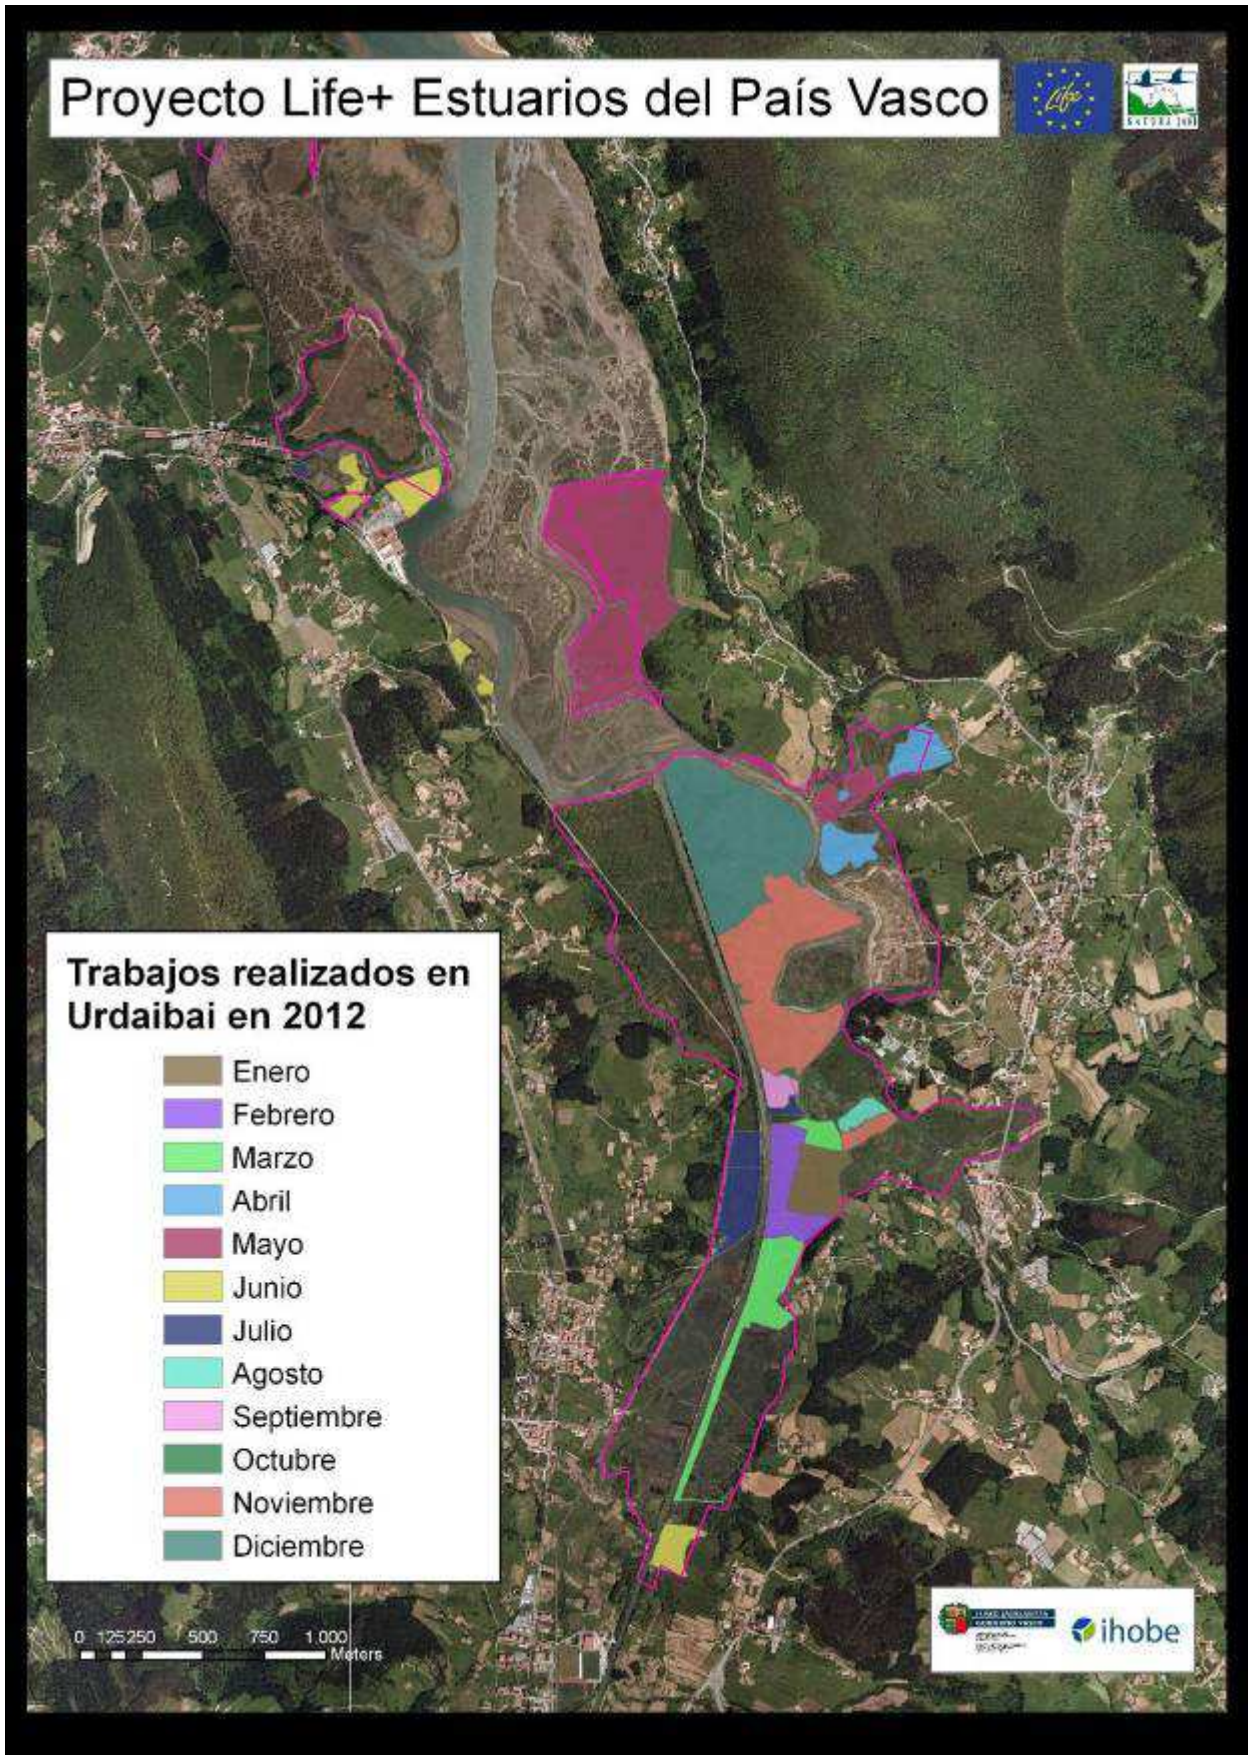

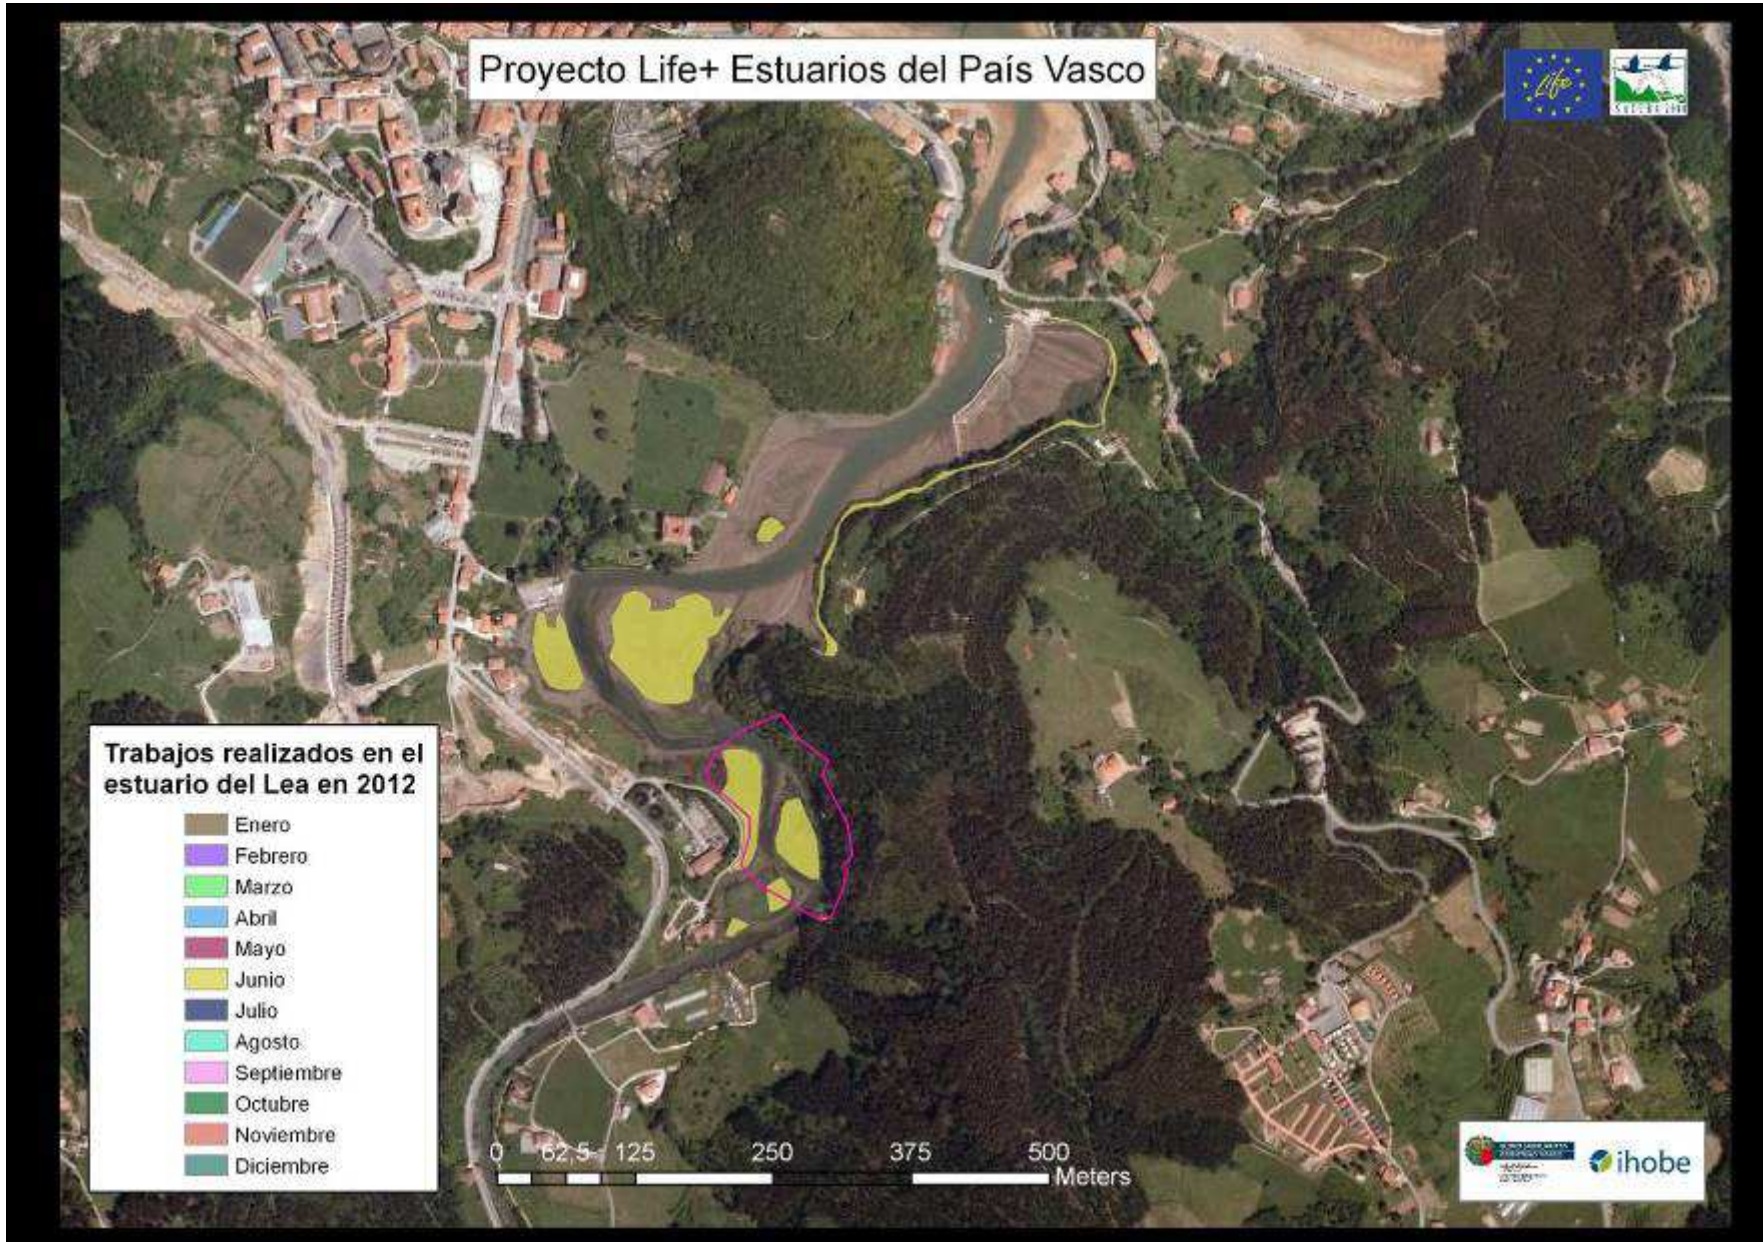

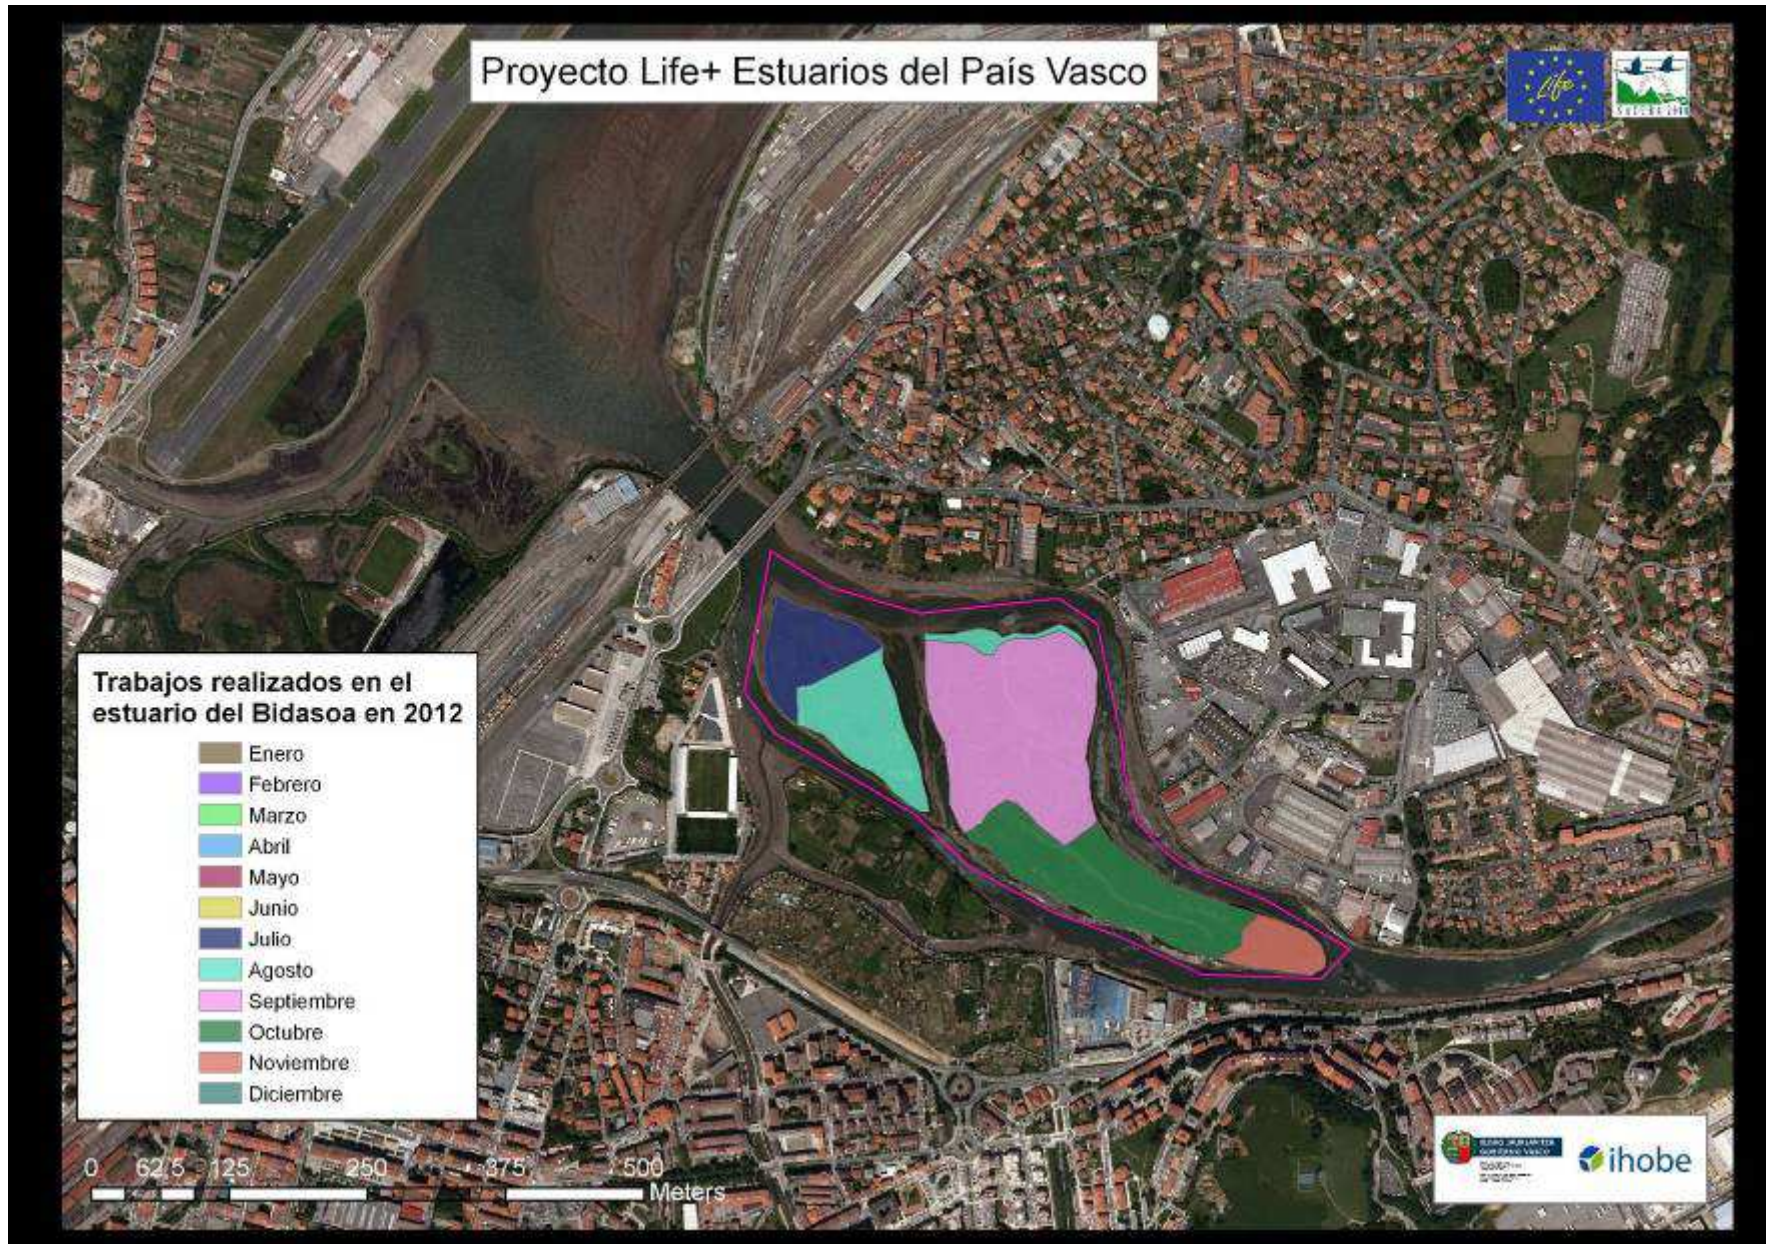



D. INFORMACIÓN AL PÚBLICO Y DIVULGACIÓN DE RESULTADOS

Acción	Plazo	Estado	Descripción
D1. Paneles de información del proyecto (fijos y móviles)	31/03/2010	Iniciada	Se han repuesto los vinilos de los paneles de Txingudi y Urdaibai por deterioro
D2. Difusión del proyecto en página web	31/06/2010	Iniciada	
D3. Informe layman del proyecto	31/12/2013	No iniciada	Previsto para 2013
D4. Comisión internacional de seguimiento y difusión de experiencias	30/06/2011	Iniciada	
	30/06/2013		
D5. Jornada técnica especies invasoras en la Red Natura 2000	31/10/2011	Finalizada	
D6. Campaña de divulgación y educación ambiental "Restaurando los hábitats de los estuarios"	31/05/2010	Iniciada	Folleto divulgativo Se están distribuyendo los 10.000 ejemplares del folleto a través del Centro de Biodiversidad de Euskadi
	2012	Finalizada	Concurso de fotografía La exposición de fotografía "Estuarios: amenazas y conservación" se ha instalado en Lekeitio (casa de cultura) y Urdaibai (Centro de Biodiversidad de Euskadi-Busturia) durante los meses de julio y agosto.
	2012 y 2013	Iniciada	Visitas didácticas Se ha iniciado el programa escolar 2012-2013 en el Centro de Biodiversidad de Euskadi. Durante la segunda mitad del año, 120 alumnos han realizado la visita específica del proyecto Life.

	2010	Iniciada	<p>Divulgación en medios de comunicación</p> <p>Se han remitido dos notas de prensa (inicio de los trabajos en las Islas del Bidasoa y presentación del proyecto en Congreso NEOBIOTA 2012)</p> <p>Se ha publicado un artículo sobre el proyecto en la revista Sustrai (Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco).</p> <p>El proyecto ha sido presentado en los siguientes congresos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Congreso Nacional EEI 2012 (Pontevedra) presentación oral y póster - NEOBIOTA 2012 (Pontevedra) póster <p>Además, se ha participado en la elaboración del Pest Risk Assessment (Valoración de Riesgo de Plaga) que la European Plant Protection Organization ha realizado para la especie <i>Baccharis halimifolia</i> a nivel europeo. Se puede consultar la información en el siguiente enlace: http://www.eppo.int/MEETINGS/2012_meetings/ewg_baccharis.htm</p>
	No prevista	Finalizada	<p>La exposición "<i>Baccharis halimifolia</i>, historia de una invasión" instalada en el Centro de Biodiversidad de Euskadi ha recibido más de 36.000 visitas durante el año 2012.</p>



E. FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL PROYECTO Y SEGUIMIENTO

Acción	Plazo	Estado	Descripción
E1. Gestión del proyecto por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco	31/01/2010	Iniciada	Seguimiento continuo del proyecto por parte del Comité de Pilotaje y contacto con equipo externo de seguimiento del Programa LIFE. 1 reunión celebrada durante el segundo semestre.
	30/09/2010	Iniciada	Durante el mes de diciembre, se ha iniciado la recopilación de información para redactar el Informe de progreso, previsto remitir en enero de 2013.
E2. Seguimiento de resultados del proyecto	31/12/2010	Iniciada	La campaña de seguimiento se ha desarrollado desde septiembre de 2012, con la revisión de las parcelas permanentes, la instalación de nuevas parcelas en las nuevas áreas tratadas y la realización de transectos. A finales de diciembre se terminó la redacción del tercer informe de seguimiento, que está disponible en la página web.
E3. Auditoría	31/03/2014	No iniciada	Previsto elaborar al final del proyecto
E4. Plan de Conservación posterior a LIFE		No iniciada	Previsto elaborar durante 2013
E5. Medidas de seguimiento e investigación sobre la aplicación del glifosato	Antes de inicio de C1 y C2	Finalizada	Plan de Contingencia elaborado y en aplicación durante los trabajos de eliminación de vegetación invasora.
	Antes de inicio de C1 y C2	Finalizada	Plan de Seguridad y Salud de empresa adjudicataria elaborado en septiembre 2010 y en aplicación durante los trabajos de eliminación de vegetación invasora.
	Durante periodo del proyecto	Finalizada	Finalización del estudio e informe sobre la toxicidad del glifosato y la mezcla utilizada en el proyecto Life por el equipo de investigación de la UPV/EHU. (Descargar informe final)



	Durante periodo del proyecto	Iniciada	<p>Análisis continuado de datos de la Red de Seguimiento del Estado Ecológico de las aguas de transición y costeras del Gobierno Vasco.</p> <p>Se prevé remitir el informe de la campaña 2011 junto con el Informe de progreso.</p>
--	------------------------------	----------	---

