

Restaurando los hábitats de los estuarios



PROYECTO LIFE08NAT/E/000055

Restauración de hábitats de interés comunitario
en estuarios del País Vasco

Resumen de avances – 2013/1



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL




www.euskadi.net/life_estuarios

AVANCES DEL PROYECTO ENERO-JUNIO 2013

C. ACCIONES CONCRETAS DE CONSERVACIÓN

Acción	Plazo/Inicio	Estado	Descripción
C1. Primer tratamiento de áreas afectadas por vegetación invasora			En la primera mitad del año, se han realizado trabajos de repaso en Urdaibai, completando todas las zonas iniciadas el año anterior. En Txingudi, se ha proseguido con el primer tratamiento en los sectores ampliados.
C2. Repaso de áreas tratadas	30/09/2013	Iniciadas	<p>Durante estos meses se han realizado las siguientes superficies:</p> <p>Urdaibai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Repaso (arranque manual): 32,85 hectáreas - Repaso (aplicación de herbicida): 43,81 hectáreas <p>Txingudi (Fase II):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Primera actuación (aplicación de herbicida): 11,90 hectáreas
C3. Revegetación de áreas tratadas	31/05/2013	Iniciada	<p>Durante los meses de febrero y marzo se ha realizado la plantación de 7.000 árboles y arbustos en las Islas del Bidasoa.</p> <p>En el mes de mayo se ha realizado la primera revisión. Todas las especies plantadas están evolucionando favorablemente, excepto algunos ejemplares ubicados en zonas expuestas a las mareas.</p>



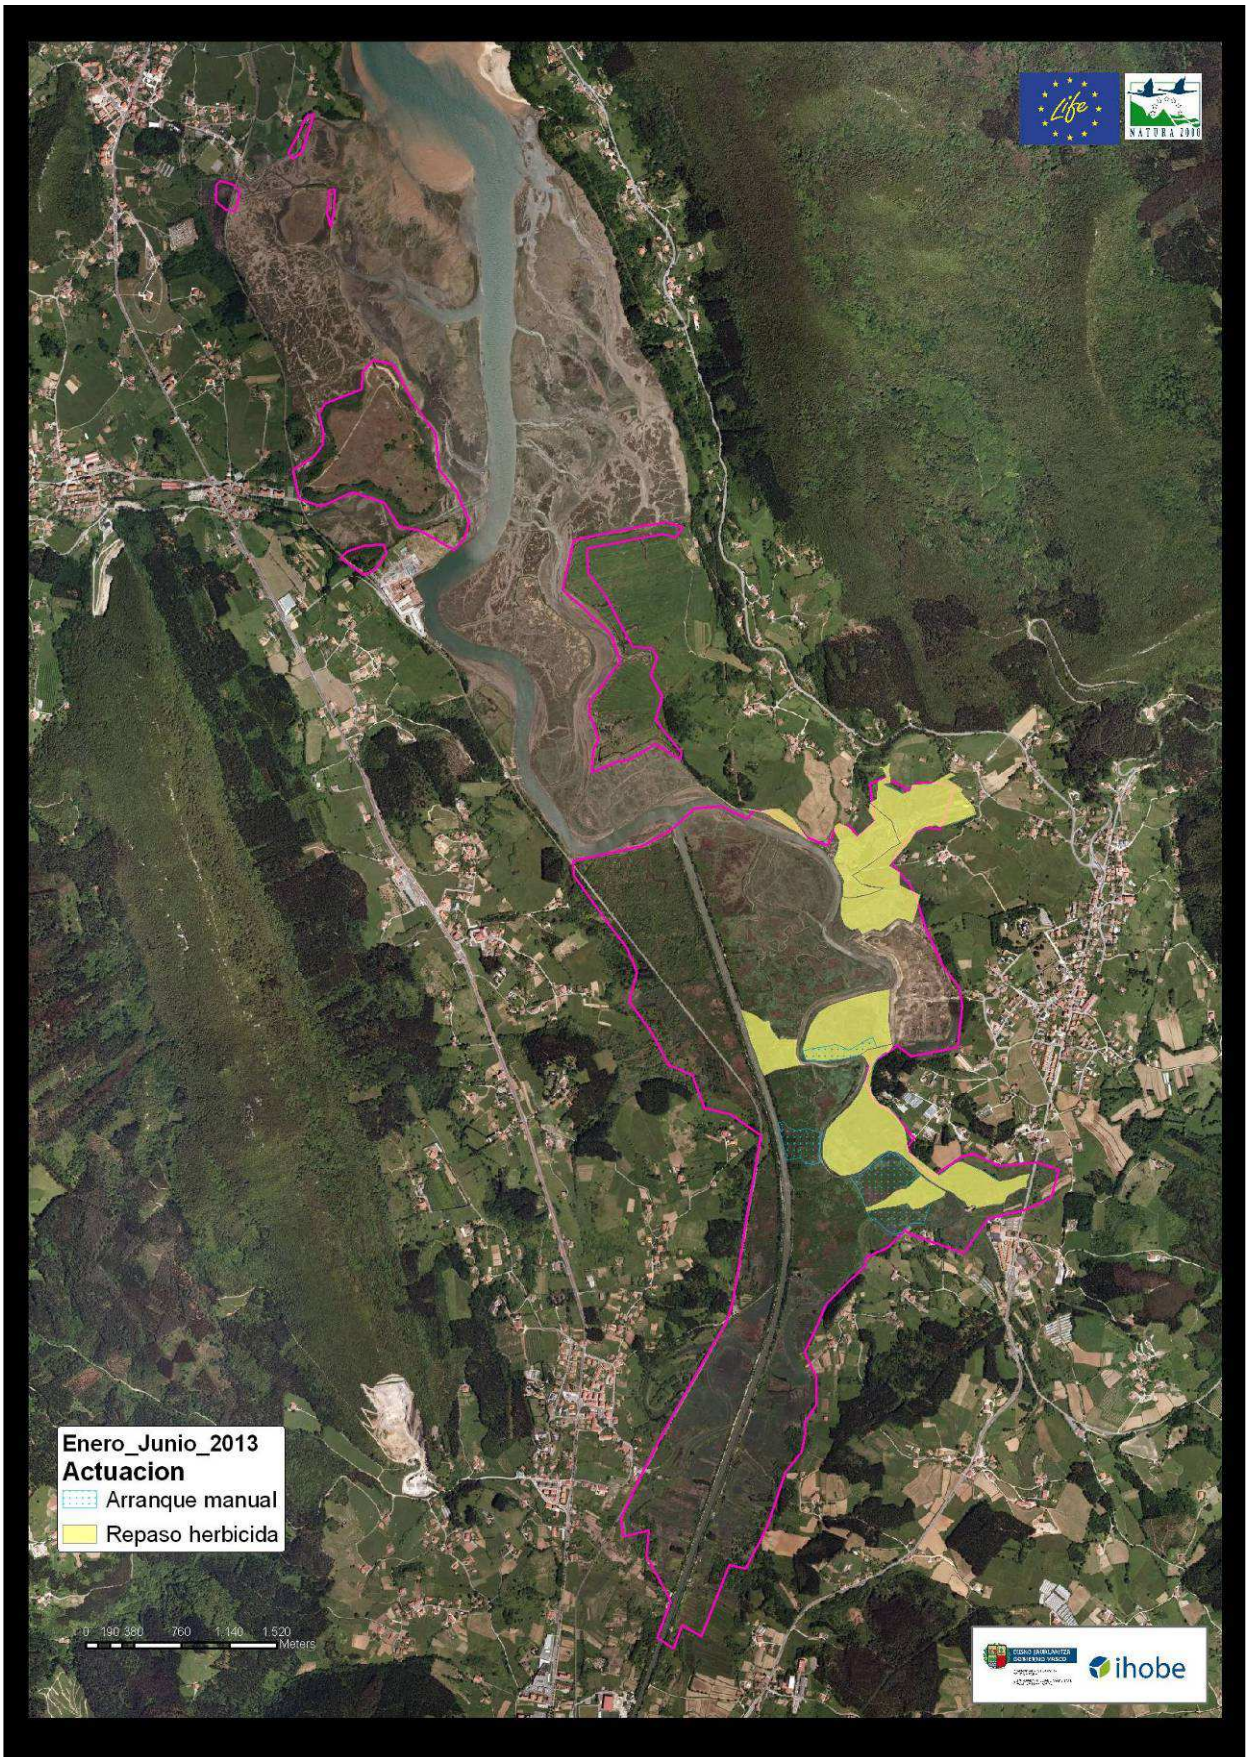



D. INFORMACIÓN AL PÚBLICO Y DIVULGACIÓN DE RESULTADOS

Acción	Plazo/Inicio	Estado	Descripción
D1. Paneles de información del proyecto (fijos y móviles)	31/03/2010	Finalizada	
D2. Difusión del proyecto en página web	31/06/2010	Iniciada	
D3. Informe layman del proyecto	31/12/2013	No iniciada	Previsto iniciar en 2013
D4. Comisión internacional de seguimiento y difusión de experiencias	30/06/2011	Iniciada	Se ha iniciado la preparación de la segunda sesión, con la actualización de lista de agentes y primeros contactos informativos. Se prevé la celebración en el mes de noviembre.
	30/06/2013		Se ha contratado la realización de un manual de gestión de <i>B. halimifolia</i> que será presentado y analizado durante la sesión. Para ello, se obtendrá un borrador avanzado que se pondrá en práctica durante la sesión.
D5. Jornada técnica especies invasoras en la Red Natura 2000	31/10/2011	Finalizada	
D6. Campaña de divulgación y educación ambiental "Restaurando los hábitats de los estuarios"	31/05/2010	Iniciada	Folleto divulgativo Se plantea realizar un folleto práctico, dirigido a entidades locales, que recoja información útil para la gestión de la especie invasora <i>B. halimifolia</i> y otras invasoras de los mismos hábitats. Para ello, se prevé trabajar el contenido con entidades municipales interesadas.
		Finalizada	
	2012 y 2013	Iniciada	Visitas didácticas Oferta de visitas guiadas desde el Centro de Biodiversidad de Euskadi. Junio: - Visita técnica del Congreso de EUROPARC 2013, celebrado en Urdaibai. - Visita del Comité científico del Conservatoire du Littoral a los trabajos realizados en Txingudi.

	2010	Iniciada	<p>Divulgación en medios de comunicación y congresos</p> <p>Durante la primera mitad del año se han elaborado 4 notas de prensa.</p> <p>Abril: participación en las II Jornadas sobre especies exóticas invasoras en ríos y zonas húmedas celebradas en Banyoles (Girona) con una presentación sobre los resultados del proyecto. Tanto la presentación como el resumen están disponibles en http://consorcidelestany.org/index.php?especies-invasoras-documentos.</p> <p>Mayo: presentación del proyecto en Ekinaren Eguna celebrado en Txingudi Ekoetxea (Irun).</p>
	No prevista	Finalizada	<p>La exposición "<i>Baccharis halimifolia</i>, historia de una invasión" ha itinerado por otras localidades. Durante los meses de enero a abril se ha instalado en el Parque Ecológico de Plaiaundi (Irun), la Casa de Cultura de Lekeitio y la Kofradia Zaharra de Ondarroa, con un número de visitantes cercano a 700 personas. A partir de finales de abril, la exposición permanece en las instalaciones del Centro de Biodiversidad de Euskadi en Busturia (Urdaibai).</p>



E. FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL PROYECTO Y SEGUIMIENTO

Acción	Plazo/Inicio	Estado	Descripción
E1. Gestión del proyecto por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco	31/01/2010	Iniciada	Seguimiento continuo del proyecto por parte del Comité de Pilotaje y contacto con equipo externo de seguimiento del Programa LIFE. 1 reunión celebrada durante el primer semestre. En junio se celebró la reunión de seguimiento anual con el equipo externo del programa Life.
	30/09/2010	Iniciada	En Enero se remitió el Informe de Progreso a la Comisión Europea. En Abril se recibió respuesta con la aprobación del mismo.
E2. Seguimiento de resultados del proyecto	31/12/2010	Iniciada	
E3. Auditoría	31/03/2014	Iniciada	Contratada la empresa auditora, se ha realizado una preauditoría para valorar la gestión financiera del proyecto.
E4. Plan de Conservación posterior a LIFE		No iniciada	Previsto elaborar durante 2013
E5. Medidas de seguimiento e investigación sobre la aplicación del glifosato	Antes de inicio de C1 y C2	Finalizada	Plan de Contingencia elaborado y en aplicación durante los trabajos de eliminación de vegetación invasora.
	Antes de inicio de C1 y C2	Finalizada	Plan de Seguridad y Salud de empresa adjudicataria elaborado en septiembre 2010 y en aplicación durante los trabajos de eliminación de vegetación invasora.
	Durante periodo del proyecto	Finalizada	Finalización del estudio e informe sobre la toxicidad del glifosato y la mezcla utilizada en el proyecto Life por el equipo de investigación de la UPV/EHU. (Descargar informe final)
	Durante periodo del proyecto	Iniciada	Análisis continuado de datos de la Red de Seguimiento del Estado Ecológico de las aguas de transición y costeras del Gobierno Vasco.

